

H30年度 焼却炉

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

施設名	排ガス処理施設(バグフィルター)	排ガス冷却施設(冷却塔)
ばいじんの除去を行った日	運転中に自動パージ	定期作業除去

※除去日と量は日報に記録

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

採取位置		1	1	1
採取した年月日		H30.11.16	H30.7.13	H30.11.16
検査結果が得られた年月日		H30.12.5	H30.7.25	H30.11.28
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N]		0.21	-	-
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん濃度 [g/m ³ N]	-	0.021	0.053
	硫黄酸化濃度 [m ³ N/h]	-	<0.03	<0.03
	窒素酸化物濃度 [ppm]	-	53	88
	塩化水素濃度 [mg/m ³ N]	-	15	35

※測定位置は、下記図1.参照

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)

[規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	測定位置 2	960	1,010	960	990	980	990	1,020	980	980	980	980	990
	測定結果(平均) [°C]												
集塵機流入 ガス温度	測定位置 3	185	185	185	183	185	185	185	185	185	185	185	185
	測定結果(平均) [°C]												
排ガス中の 一酸化炭素	測定位置 1	22	12	9	2	3	12	8	10	11	2	5	6
	測定結果(平均) [ppm]												

※測定位置は、下記図1.参照

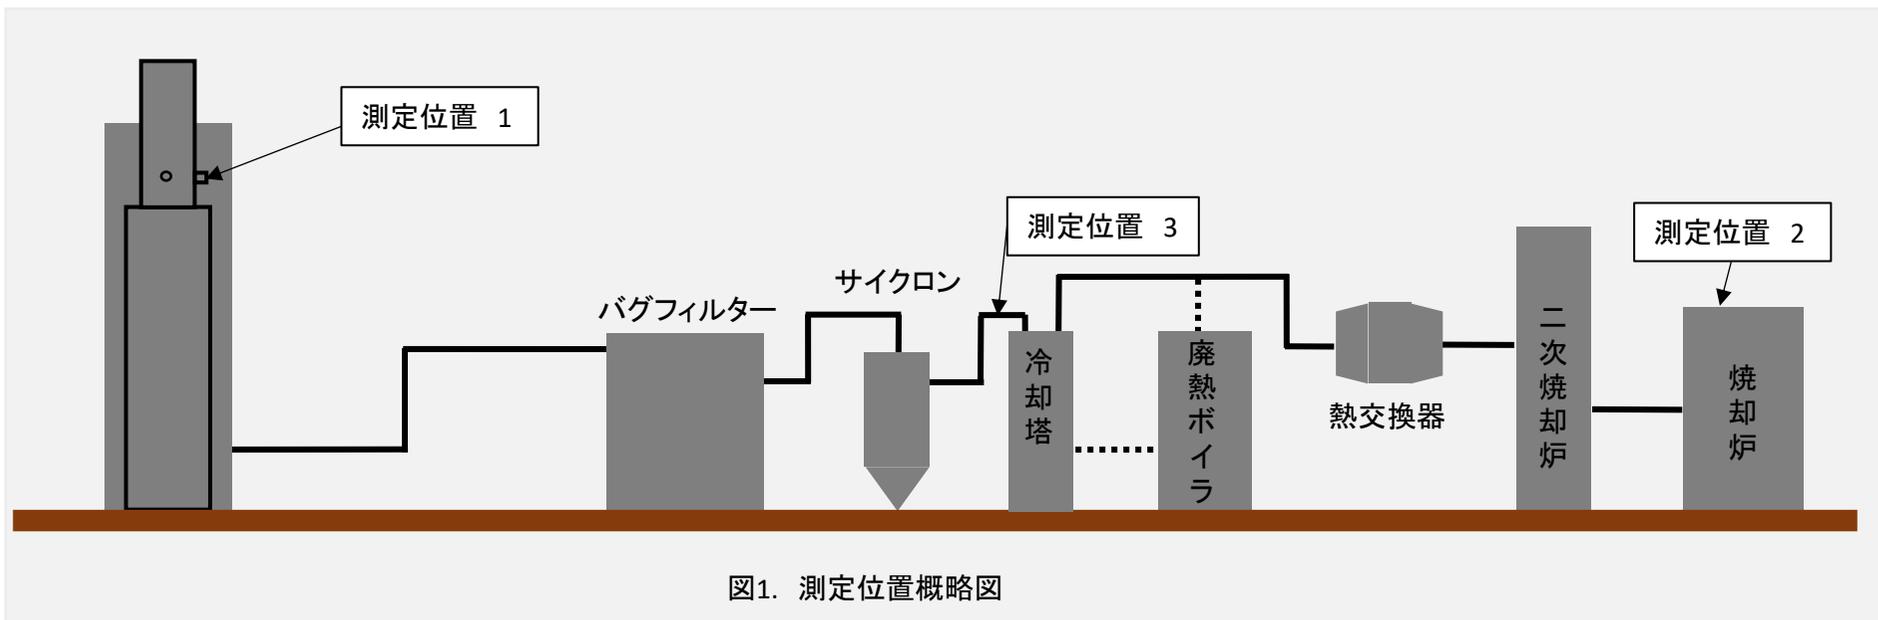


図1. 測定位置概略図
