

R5年度 焼却炉
ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

施設名	排ガス処理施設(バグフィルター)	排ガス冷却施設(冷却塔)
ばいじんの除去を行った日	運転中に自動パージ	定期作業除去

※除去日と量は日報に記録

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

採取位置		1	1	1
採取した年月日		R5.5.30		
検査結果が得られた年月日		R5.6.22		
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m³N]		-		
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん濃度 [g/m³]	0.005		
	硫黄酸化濃度 [m³/h]	0.034未満		
	窒素酸化物濃度 [ppm]	63		
	塩化水素濃度 [mg/m³]	51		

※測定位置は、下記図1.参照

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)
[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	測定位置 2	878	865	855	860	852	855	848					
	測定結果(平均) [°C]												
集塵機流入 ガス温度	測定位置 3	185	185	185	184	185	184	186					
	測定結果(平均) [°C]												
排ガス中の 一酸化炭素	測定位置 1	5	5	5	2	5	5	5					
	測定結果(平均) [ppm]												

※測定位置は、下記図1.参照

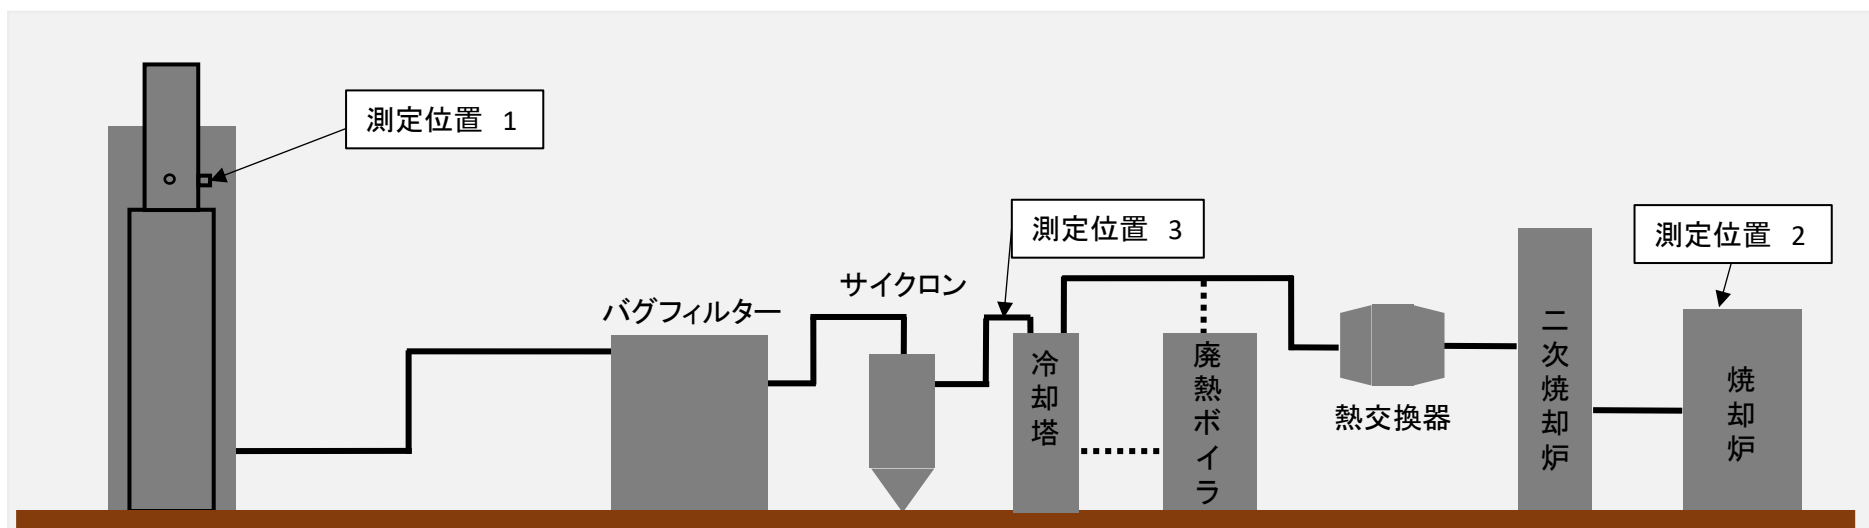


図1. 測定位置概略図
